

Doutor-AI × TopMed.

Alinhamento de iniciativas, prioridades e arquitetura de implementação — proposta consolidada de **governança & roadmap** entre as equipes.

VERSÃO

v1.0

PUBLICAÇÃO

Maio • 2026

LOCALIDADE

São Paulo • Brasil

▸ SUMÁRIO

O que tem aqui dentro.

I	Contexto & Governança	03 – 04
	Desafio central · Framework de governança	
II	Portfólio de Iniciativas 2026	05
	Visão integrada das três frentes ativas	
III	Iniciativa 01 · POC Auditoria Clínica PACK	06 – 08
	Como funciona · Timeline & Entregáveis · Próximos passos	
IV	Iniciativa 02 · POC Triagem Clínica por Voz	09 – 11
	Jornada · Algoritmos & Desfechos · Próximos passos	
V	Iniciativa 03 · Copilotos de IA para Telemedicina	12 – 15
	Contexto · Solução & Entregas · Inputs/Outputs · Próximos passos	
VI	Cronograma Consolidado	16
	Visão integrada das três frentes — Março a Maio/26+	
VII	Cronogramas	17 – 19
	Cronogramas executivos por frente	
VIII	Consolidado de Horas Trabalhadas	20
	Resumo das atividades executadas + acesso à planilha completa	
IX	Orçamento	21
	Estimativa de implantação por frente · R\$ 250/hora	

I · DESAFIO CENTRAL

O Desafio Central · por que este alinhamento é indispensável.

Quatro tensões inerentes à integração entre Doutor-AI e TopMed.

01 · MÚLTIPLAS EXPECTATIVAS

Diversas áreas, visões distintas

Diversas áreas e personas têm visões distintas sobre o papel da IA — sem alinhamento estruturado, cada equipe opera com premissas diferentes.

02 · POC VS. PRODUÇÃO

Tratamentos fundamentalmente distintos

Iniciativas experimentais e soluções de produção exigem tratamentos diferentes: escopo, riscos, timelines e arquiteturas. POCs validam funcionalidades; as definições para produção devem ser aprofundadas e validadas por TI/TOPMED × PRODUTOS/Doutor-AI com alinhamento aos usuários de negócio.

03 · PLATAFORMA TOPMED COMO CENTRO

Nenhum fluxo paralelo

Nenhuma solução de IA deve criar fluxos paralelos. Tudo precisa ser orquestrado dentro da plataforma oficial TopMed — **sem shadow systems**.

04 · TRÊS ÁREAS, UMA DECISÃO

Convergência de prioridades

Negócio, TI/TopMed e Produto/Doutor-AI precisam convergir em prioridades, arquitetura e entregáveis — especialmente nos projetos de produção.

PRINCÍPIO

Governança clara entre Negócio, TI/TopMed e Produto/Doutor-AI é o alicerce de toda entrega bem-sucedida.

I · FRAMEWORK

Framework de Governança.

Toda demanda passa por este processo antes de entrar em execução.



Classificação da demanda

EXPERIMENTAL · POC

- Validação técnica/clínica
- Escopo limitado
- Sem integração de produção
- Entrega de planilha/relatório

PRODUÇÃO

- Integração na Plataforma TopMed
- Kick-off formal
- Prototipação aprovada
- Interfaces definidas com TI

REGRA DE OURO

Todas as iniciativas de produção são integradas **exclusivamente na Plataforma TopMed** — sem fluxos paralelos.

II · PORTFÓLIO

Portfólio de Iniciativas 2026.

Três demandas ativas — duas experimentais e um projeto de produção.

EXPERIMENTAL

01

POC · Auditoria de Atendimentos Clínicos

PROTOCOLO PACK

Agentes de IA transcrevem e preenchem automaticamente fichas de auditoria baseadas no protocolo clínico **PACK**, validando assertividade antes da integração sistêmica.

EM EXECUÇÃO

EXPERIMENTAL

02

POC · Triagem Clínica por Voz

CANAL TELEFÔNICO

Agente de IA atende ligações, valida elegibilidade via API TopMed e conduz triagem clínica por voz com **4 algoritmos**. Dashboard de resultados em tempo real.

EM ALINHAMENTO

PRODUÇÃO

03

Copilotos de IA para Telemedicina

PLATAFORMA TOPMED

Kick-off formal com Área de Produtos TopMed. Definição de fluxos, interfaces, metadados e prototipação para **integração nativa** na plataforma oficial.

KICK-OFF

PRINCÍPIO

Todas as iniciativas de produção são integradas exclusivamente na Plataforma TopMed — **sem fluxos paralelos**.

Auditoria Clínica PACK.

Agentes de IA automatizam **100% das auditorias** de
atendimentos ▸ Protocolo PACK ▸ Validação clínica humana.

III · INICIATIVA 01 · COMO FUNCIONA

POC · Auditoria Clínica PACK.

Agentes de IA automatizam 100% das auditorias de atendimentos · Protocolo PACK.

Solução. Agentes de IA recebem gravações de atendimentos clínicos, transcrevem com STT, interpretam o conteúdo e preenchem automaticamente a ficha de auditoria segundo os critérios e guidelines do **Protocolo PACK** — entregando os resultados tabulados para revisão e validação clínica humana.

Como funciona



Recebe
gravação



Transcreve
(STT/IA)



Analisa
conteúdo



Preenche
ficha PACK



Tabula
resultados

INPUTS

- Gravações de atendimentos (áudio)
- Prontuários (PEP) — Médico & Enfermagem
- Ficha modelo de auditoria PACK
- Guidelines clínicos do protocolo
- REMUNE Blumenau & Florianópolis (13/03)

OUTPUTS

- Ficha de auditoria preenchida automaticamente
- Planilha tabulada com 100% dos atendimentos
- Sinalização de desvios e não-conformidades

RESULTADOS ESPERADOS

- Cobertura 100% vs. amostragem atual
- Eliminação do processo 100% manual
- Profissional foca em validação técnica
- Base para futura integração sistêmica

Após validação clínica, o próximo passo é alinhar com TI/TopMed como incorporar o fluxo de automação na plataforma oficial.

III · INICIATIVA 01 · TIMELINE & ENTREGÁVEIS

Timeline & entregáveis.

POC Auditoria Clínica PACK · Março 2026.

20/02 · ✓

Chamadas disponibilizadas

Gravações de atendimentos clínicos entregues à equipe Doutor-AI para início do processamento.

11/03 · ✓

Planilha de auditoria manual

Recebimento da planilha com exemplos de auditorias manuais — base de guideline para os agentes. Novas fichas técnicas e REMUNE adicionadas nas regras (13/03).

12-13/03

Processamento IA + Tabulação

Execução dos agentes de IA sobre os atendimentos: transcrição, análise, preenchimento das fichas PACK e tabulação completa.

24/03

Validação pelo Negócio

Resultados entregues para usuários de negócio TopMed avaliarem assertividade clínica. Decisões: incluir prontuários e auditoria de Enfermagem.

Pós-validação · próximos passos

ALINHAMENTO TI/TOPMED

Definição de como a plataforma TopMed incorporará o fluxo de automação de auditorias — interfaces de integração entre sistemas. Aguardando recebimento dos prontuários de consultas e gravações de enfermagem (25/03).

ESCALA PARA 100% DOS ATENDIMENTOS

Após aprovação clínica da POC, evolução para automação contínua em produção — cobrindo todos os atendimentos da operação.

III · INICIATIVA 01 · PRÓXIMOS PASSOS

Próximos passos · POC Auditoria.

Ações imediatas para desbloqueio e avanço da iniciativa.

01	Primeira rodada de processamento concluída Decisão de ampliar a auditoria com mais gravações e PEP. Receber prontuários de consultas e enfermagem. Novas fichas de Enfermagem para novo processamento.	Doutor-AI	ENTREGUE
02	Resultados disponibilizados para validação Resultados disponibilizados para validação clínica pelos usuários de negócio TopMed.	Doutor-AI	ENTREGUE
03	Processamento do feedback e treinamento de regras Estamos processando o feedback, treinando as regras e prevemos liberar para nova rodada de testes na segunda-feira.	Doutor-AI	PREV. 14/05
04	Novos áudios para processamento Cris passou para o Thiago novos áudios para processamento na semana do dia 27/04. Processamento em execução, com entrega prevista até sexta-feira.	Doutor-AI	PREV. 14/05
05	Cronograma do ambiente de produção Mapeamos as atividades necessárias para criação do ambiente de produção da auditoria — cronograma elaborado e disponível na Seção VII.	Doutor-AI	PREV. 14/05

Triagem Clínica por Voz.

Agente de IA receptivo ▸ Canal Telefônico ▸ **4 algoritmos clínicos**
▸ Elegibilidade via API TopMed.

POC · Triagem Clínica por Voz.

Agente de IA receptivo · 4 algoritmos clínicos · Elegibilidade via API TopMed em tempo real.

Solução. O agente de IA atende ligações inbound (0800), coleta CPF por voz, valida elegibilidade via API TopMed em tempo real, conduz triagem estruturada por voz usando **4 algoritmos clínicos validados**, classifica o risco e orienta o paciente ao desfecho correto. Toda jornada é registrada em planilha e um dashboard monitora os resultados da POC.

Jornada do paciente

1

Liga para o 0800

2

IA coleta CPF valida API

3

Triagem 4 algoritmos

4

Classifica risco/desfecho

5

Orienta e registra jornada

INPUTS

- Ligação inbound do paciente (voz)
- CPF para validação de elegibilidade
- API de elegibilidade TopMed
- 4 algoritmos clínicos (Excel validado)

OUTPUTS

- Triagem estruturada concluída por voz
- Desfecho clínico e orientação ao paciente
- Log completo da jornada em planilha
- Dashboard de resultados em tempo real

RESULTADOS ESPERADOS

- Cobertura 24/7 sem operador humano
- Consistência clínica via algoritmos validados
- Dados para decisão de escala para produção
- Redução de filas e melhora da experiência

POC de 15 dias após entrega · 2 números dedicados (homologação interna + testes TopMed).

IV · INICIATIVA 02 · ESCOPO & ALGORITMOS

Escopo, algoritmos & pendências.

4 algoritmos clínicos validados · 4 desfechos possíveis · Materiais TopMed.

4 algoritmos clínicos

1

Síndrome Viral

Triagem de sintomas gripais, febre e infecções respiratórias

2

Diarreia

Avaliação de quadros gastrointestinais e risco de desidratação

3

Cefaleia

Classificação de dores de cabeça e identificação de sinais de alerta

4

Sintomas Urinários

Triagem de infecções urinárias e sintomas do trato urinário

Desfechos possíveis



Autocuidado

Orientações e monitoramento domiciliar



Teleconsulta

Agendamento de consulta remota



Presencial

Encaminhamento a unidade de saúde



Emergência

Acionamento imediato de emergência (SAMU/UPA/EH)

Materiais TopMed

Documentação API de elegibilidade

RECEBIDO

CPFs de teste (ambiente sandbox)

RECEBIDO

Lista fechada de desfechos

RECEBIDO

KPIs desejados para o dashboard

RECEBIDO

Algoritmos clínicos (4 Excel)

RECEBIDO

Estimativa total: 14–20 dias úteis após recebimento dos materiais pendentes. POC roda 15 dias com acompanhamento via dashboard.

IV · INICIATIVA 02 · PRÓXIMOS PASSOS

Próximos passos · POC

Triagem por Voz.

Ações imediatas para desbloqueio e avanço da iniciativa.

01	Dashboard de logs + KPIs + números de homologação/produção Entrega completa do dashboard com logs e KPIs, junto com números dedicados de homologação e produção para a equipe TopMed.	Doutor-AI	ENTREGUE
02	Melhorias no agente de voz da triagem Implementação de melhorias no agente, tornando-o mais fluido — como o agente usado na demonstração do Maurício.	TopMed + Doutor-AI	ENTREGUE
03	Relatório de resultados de testes + áudios Recebimento de um relatório consolidado dos resultados de testes realizados, juntamente com os áudios dessas execuções.	TopMed	SUGESTÃO 08/05
04	Implementação das melhorias + novo relatório Aplicação das melhorias conforme apontamentos do relatório do dia 08/05; geração de um novo relatório de testes a ser compartilhado até 14/05.	TopMed + Doutor-AI	PENDENTE

O avanço da iniciativa depende do recebimento de materiais e decisões confirmadas nas próximas reuniões.

Copilotos de IA para Telemedicina.

Integração nativa na **Plataforma Saúde24h** · 6 tipos de atendimento · 4 canais de entrada · Kick-off com Área de Produtos.


Copilotos · contexto.

Plataforma Saúde24h · 6 tipos de atendimento · 4 canais de entrada.

△ PRINCÍPIO ARQUITETURAL

Os copilotos de IA serão integrados **nativamente** na Plataforma TopMed/Saúde24h — nenhum sistema paralelo será criado. **A IA se encaixa nos fluxos já existentes.**

4 canais de entrada



6 tipos de atendimento — fluxo da plataforma



Os copilotos de IA se inserem **dentro deste fluxo existente** — ampliando a capacidade da operação sem criar novos sistemas.

Solução & entregas.

PRODUÇÃO · Integração nativa na Plataforma TopMed · Kick-off com Área de Produtos.

Solução. Copilotos de IA que se integram aos 6 tipos de atendimento da plataforma Saúde24h — assistindo médicos, enfermeiros e pacientes em tempo real. Cada copiloto é especializado em um momento da jornada: **triagem inteligente, suporte clínico durante a consulta, automação de pós-consulta e análise de jornada.** Toda integração via interfaces oficiais da plataforma TopMed.

4 fases de kick-off

01 · KICK-OFF DO PROJETO

Reunião formal com Área de Produtos TopMed. Apresentação do escopo, alinhamento de expectativas e definição de papéis. **Negócio + Produto.**

02 · MAPEAMENTO DE FLUXOS

Repasse técnico de todos os pontos de integração necessários entre Doutor-AI e TI/TopMed nos 6 tipos de atendimento. **TI/TopMed + Doutor-AI.**

03 · INTERFACES & METADADOS

Definição das primeiras interfaces, contratos de API e estrutura de metadados. Base para o início da prototipação. **Doutor-AI (liderança).**

04 · PROTOTIPAGEM & APROVAÇÃO

Protótipo do fluxo para aprovação do usuário de negócio antes da implementação — evita retrabalho e alinha expectativas. **Negócio TopMed.**

Datas orquestradas pelo Negócio e TI/TopMed — Doutor-AI garante as interfaces dentro do planejamento da plataforma.

Copilotos por momento da jornada.

PRODUÇÃO · Copilotos de IA para Telemedicina · Plataforma Saúde24h.



Copiloto de Triage (Medy+)

ATENDIMENTOS
1 E 2

Aprimora a triagem IA com NLP avançado
· detecta urgências · reduz abandono.



Copiloto Clínico (Consulta)

ATENDIMENTOS
3, 4 E 5

Assistência ao médico: sugere condutas ·
preenche prontuário · detecta alertas.



Copiloto de Pós-Consulta

TODOS OS
ATENDIMENTOS

Automação de prescrições · lembretes de
retorno · monitoramento de adesão.



Copiloto Analytics

OPERAÇÃO
TOPMED

Análise de jornada · dashboards em
tempo real · alertas de SLA e
performance.

INPUTS

- Fluxos existentes da Plataforma Saúde24h
- APIs e interfaces TI/TopMed definidas
- Dados de jornada dos 6 tipos de atendimento
- Protocolos clínicos Saúde24h/TopMed

OUTPUTS

- Copilotos integrados na plataforma oficial
- Automação de condutas e pós-consulta
- Dashboards de operação em tempo real
- Interfaces documentadas entre as partes

RESULTADOS ESPERADOS

- Escalabilidade dos 6 tipos de atendimento
- Redução de carga operacional médica
- Qualidade clínica com IA auxiliando decisões
- Zero shadow systems — tudo na plataforma

V · INICIATIVA 03 · PRÓXIMOS PASSOS

Próximos passos · Copilotos Telemedicina.

Ações imediatas para desbloqueio e avanço da iniciativa.

01

Mapeamento de fluxos da Saúde24h ↔ API Doutor-AI

Entrega do mapeamento de fluxos da Saúde24h.
Pendente com equipe TopMed.

Negócio TopMed

ENTREGUE

02

Reunião com Lucas, TopMed

Alinhamento e planejamento da versão final do documento de integração.

TopMed + Doutor-AI

REALIZADA
15/04

03

Primeira versão do documento atualizado de integração

Entrega da primeira versão do documento atualizado de integração.

Doutor-AI

ENTREGUE

04

Cronograma de desenvolvimento

Entrega do cronograma de desenvolvimento da iniciativa (disponível na Seção VII).

Doutor-AI

ENTREGUE

O avanço dos projetos depende do recebimento de materiais e decisões confirmadas nas reuniões de alinhamento.

VI · CRONOGRAMA CONSOLIDADO

Cronograma consolidado.

Visão integrada das três iniciativas · Março a Maio/26+.

INICIATIVA	MAR/26 · S1-S2	MAR/26 · S3-S4	ABR/26 · S1-S2	ABR/26 · S3-S4	MAI/26 +
 Auditoria PACK	✓ Chamadas recebidas	IA + Tabul. 12-13/03 Validação 16/03	Alinhamento TI	—	—
 Triagem por Voz	✓ Requisitos recebidos	Build agente voz 15 dias úteis	POC 15 dias	Resultados	Continuidade
 Copilotos Telemedicina	😊 Kick-off	Mapeam. Fluxos Def. Interfaces Prototipação	Implementação	Implementação	Continuidade


Cronograma sujeito a ajustes conforme disponibilização de materiais pendentes pela TopMed.
Objetivo principal: organizar as diferentes frentes com alinhamento entre equipes e expectativas unificadas. Os cronogramas executivos detalhados de cada frente estão na Seção VII.

Cronogramas.

Cronograma executivo detalhado de cada iniciativa — base para o orçamento de implantação na Seção IX.

Cronograma · Frente 1 · Triagem.


12 semanas · 7 fases · **376 horas** de execução Doutor-AI.

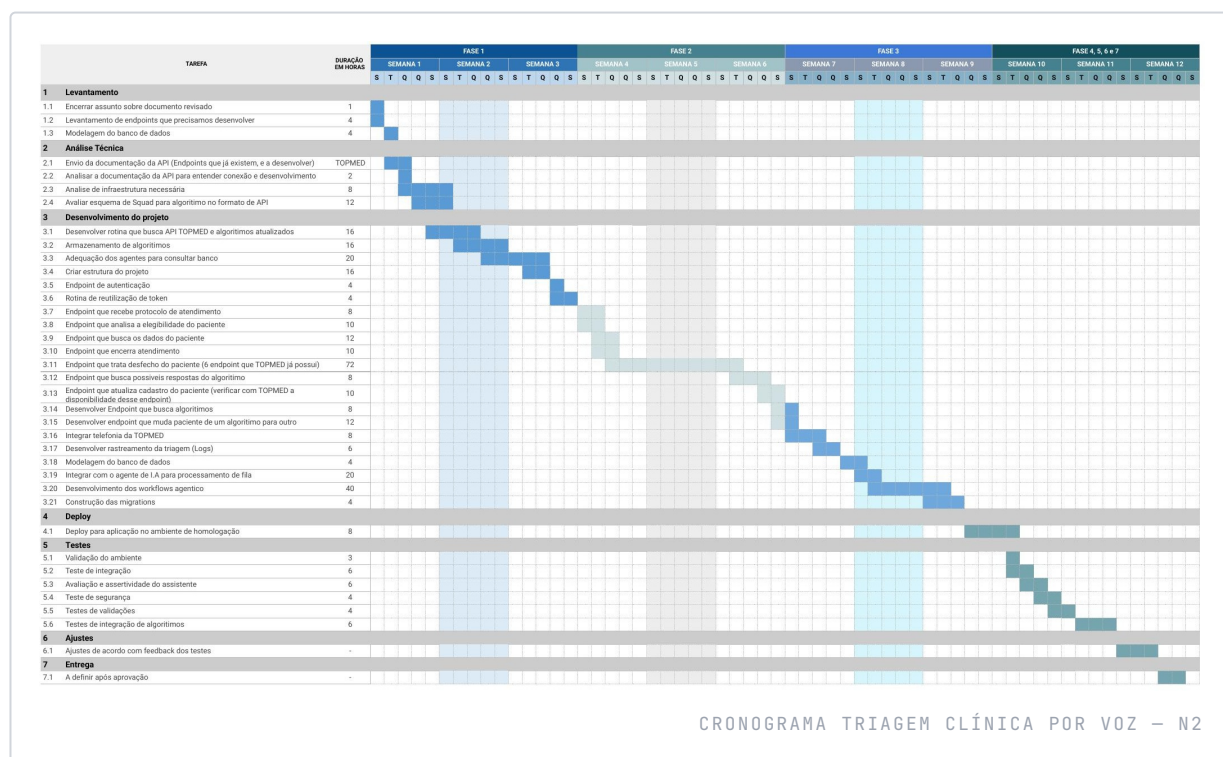

VII · CRONOGRAMA · FRETE 2 · AUDITORIA

Cronograma · Frente 2 · Auditoria.


2 semanas · 6 fases · 46 horas de execução Doutor-AI (via SFTP).

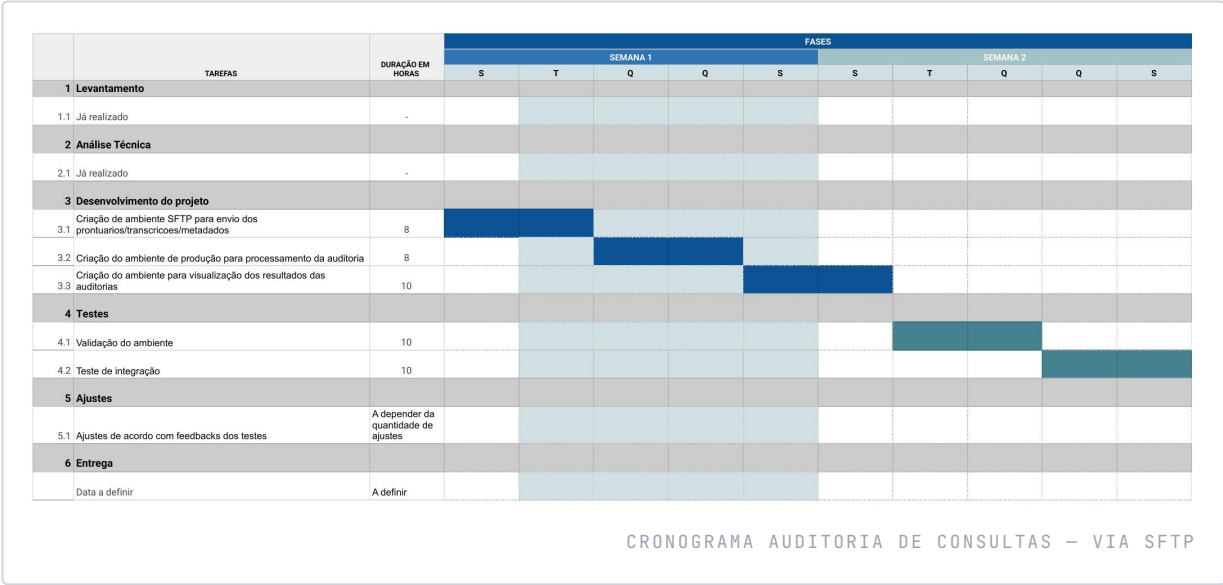

VII · CRONOGRAMA · FRENTE 3 · COPILOTO IA

Cronograma · Frente 3 · Copiloto IA.

7 semanas · 7 fases · 226 horas de execução Doutor-AI.

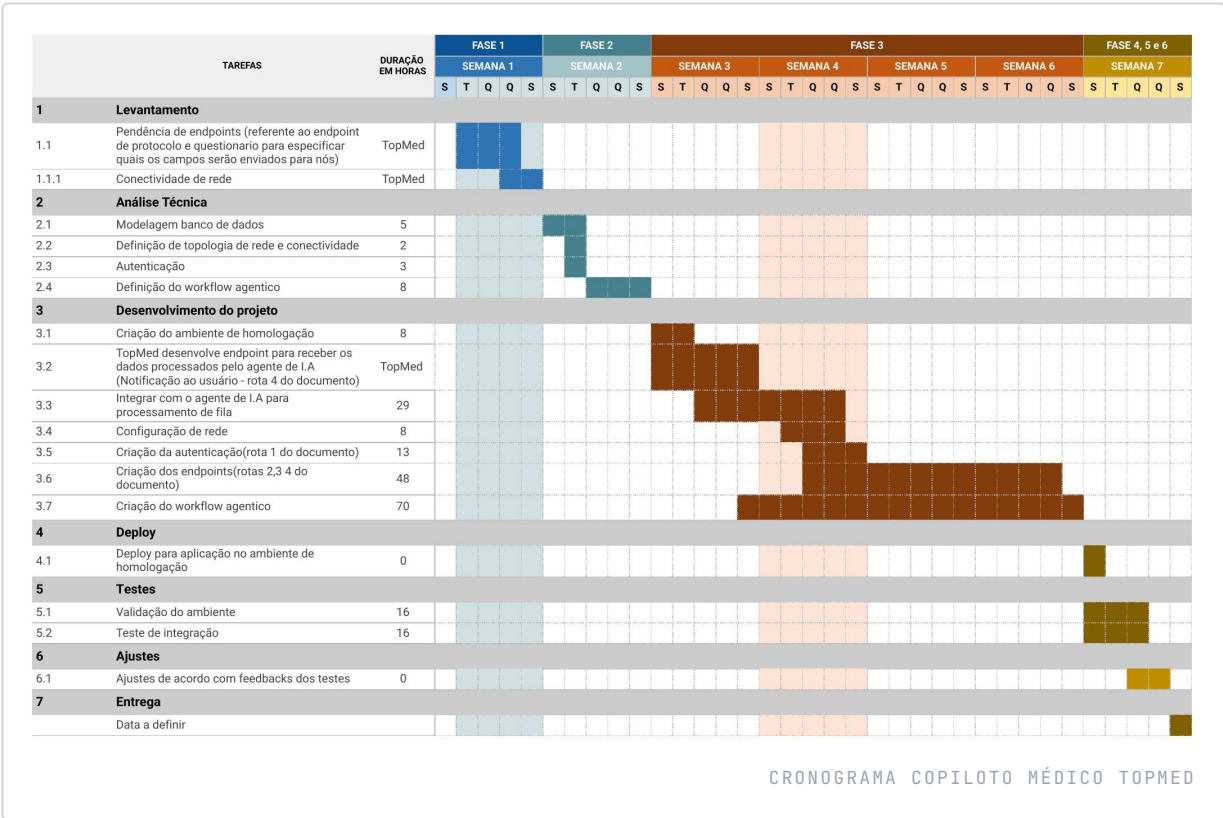

VIII · CONSOLIDADO DE HORAS TRABALHADAS

Consolidado de horas trabalhadas.

Resumo das atividades executadas pela Doutor-AI até o momento.

SOBRE ESTA PÁGINA

Esta página apresenta o **consolidado de horas executadas** pela equipe Doutor-AI nas três frentes de projeto desde o início da parceria. As horas estão segmentadas por frente, com totais em minutos, horas e valor a R\$ 250,00/hora. O **detalhamento completo** — todas as atividades, datas, colaboradores e tempos individuais — está disponível no link da planilha ao final desta página.

Resumo consolidado

FRENTE	PROJETO	MINUTOS	HORAS	VALOR/HORA	TOTAL
1	Triagem clínica por voz	24.310 min	405h 10min	R\$ 250,00	R\$ 101.291,67
2	Copiloto de IA para telemedicina	1.605 min	26h 45min	R\$ 250,00	R\$ 6.687,50
3	Auditoria de atendimentos clínicos	5.400 min	90h 00min	R\$ 250,00	R\$ 22.500,00
—	TOTAL CONSOLIDADO	31.315 min	521h 55min	R\$ 250,00	R\$ 130.479,17

PLANILHA COMPLETA · ACESSO TOTAL

Detalhamento de atividades, horas e colaboradores

Todas as atividades realizadas pela equipe Doutor-AI estão registradas na planilha abaixo — com data, colaborador, descrição da atividade e tempo dedicado.

```
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZUKAybTooVbPPiypoUVEDgGfWL2E-TsQ4B1kyt03vck/edit?usp=sharing
```


IX · ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO

Orçamento de implantação.

Estimativa de implantação por frente · base: cronogramas executivos × R\$ 250,00/hora.

METODOLOGIA

O cálculo é direto: **horas previstas no cronograma de cada frente** (Seção VII) × **R\$ 250,00/hora**. Os valores representam a estimativa preliminar de implantação e podem ser ajustados conforme a definição final de arquitetura, responsabilidades entre os times e eventuais ajustes identificados durante os testes.

Visão consolidada

FRENTE	HORAS ESTIMADAS	VALOR/HORA	VALOR ESTIMADO
Frente 1 · Triagem Clínica por Voz	376h	R\$ 250,00	R\$ 94.000,00
Frente 2 · Auditoria de Consultas — via SFTP	46h	R\$ 250,00	R\$ 11.500,00
Frente 2 · Auditoria de Consultas — via API (cenário alternativo)	46h	R\$ 250,00	R\$ 11.500,00
Frente 3 · Copilotos de IA para Telemedicina	226h	R\$ 250,00	R\$ 56.500,00
TOTAL ESTIMADO (modelo SFTP para Auditoria)	648h	R\$ 250,00	R\$ 162.000,00

Distribuição por frente

7,1% FRENTE 2 · AUDITORIA R\$ 11.500,00 · 46h (via SFTP)	58,0% FRENTE 1 · TRIAGEM POR VOZ R\$ 94.000,00 · 376h	34,9% FRENTE 3 · COPILOTOS R\$ 56.500,00 · 226h
---	--	--

OBSERVAÇÕES

Auditoria · API vs. SFTP — frente orçada nos dois cenários; a escolha do modelo orientará o cronograma final. Possível componente variável por auditoria, a definir em proposta complementar. Valores preliminares, sujeitos a ajustes conforme arquitetura final.

Juntos, construindo a Saúde do Futuro.

Doutor-AI × TopMed
